Aonde você quer chegar?


Vai com a



UniCesumar
EAD, SEMIPRESENCIAL E PRESENCIAL

Unidade 1 - Aula 2

Gestão do Projeto: Pessoas e Controle

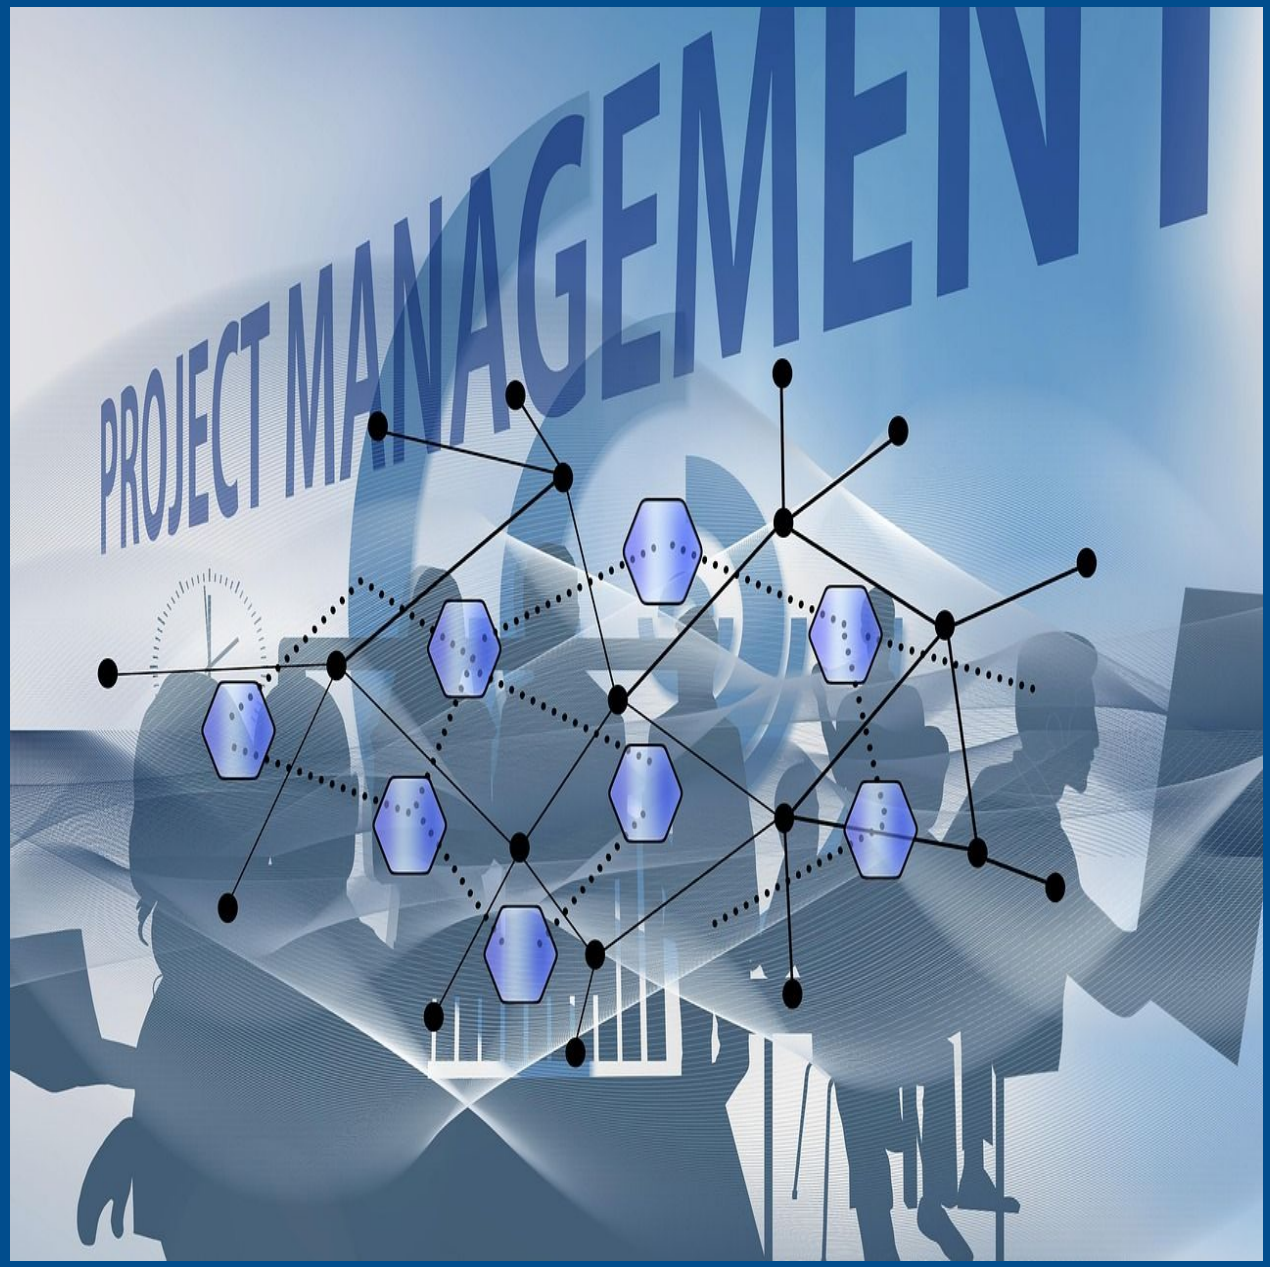

O gerente de projetos é o profissional responsável por planejar, coordenar e acompanhar as atividades necessárias para alcançar os objetivos de um projeto. Ele atua na integração entre equipe, clientes, gestores e demais partes interessadas, garantindo alinhamento e comunicação.

Gestão de Projetos Tecnológicos

Prof. Dr. Rogerio Lacerda



Objetivos da Aula

Ao final da aula, você deverá:

- Compreender o papel de um gerente de projetos;
- Compreender o que compõe a competência do gerente de projetos;
- Identificar as principais habilidades de um bom gerente de projeto;
- Identificar algumas das principais atividades de um gerente de projetos;

Processo × Projeto

São diferentes. Têm objetivos diferentes.

"Processos são contínuos. Projetos são temporários."
PMBOK® (PMI)

Processo

Conjunto de atividades que se desdobram em operações.



Foco na eficiência e na consistência.

Projeto

Processo único, com atividades e operações coordenadas e controladas, início e término definidos.



Foco no resultado, com escopo, prazo e recursos definidos.


"Projetos são empreendimentos temporários criados para entregar produtos, serviços ou resultados únicos."

— Kerzner (2009)
Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.

O GERENTE DE PROJETOS

GESTÃO DO PROJETO

Planejar · Organizar · Monitorar · Controlar

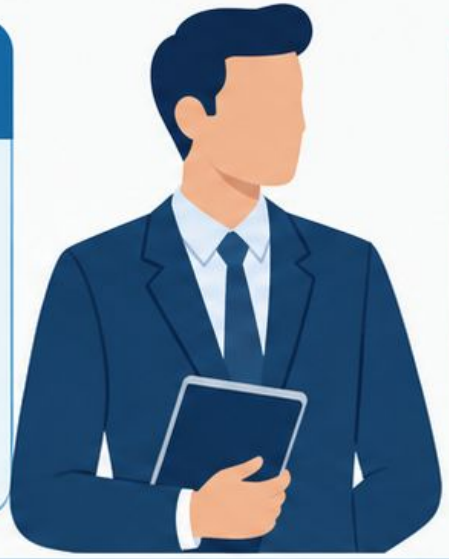

LIDERANÇA DE PESSOAS

Comunicar · Integrar · Decidir · Motivar

INÍCIO → **CONDUZ O PROJETO AO LONGO DO TEMPO** → ENTREGA

TÉCNICO + **HUMANO**

RESULTADOS

Base: PMI/PMBOK; Thamhain; Kerzner

Três Dimensões de Competência



Fonte: PMI (PMBOK® Guide) | IPMA (ICB®)

Conhecimentos do Gerente



01
Técnico e estratégico

Domínio técnico e visão de negócio.

02
Gerenciamento de projetos

Processos, práticas e boas técnicas.

03
Metodologias e ferramentas

Agilidade, tradicional e digitais.

04
Comunicação e idiomas

Clareza e visão global.

Fonte: PMI (PMBOK® Guide) | Kerzner (Project Management).

Habilidades Essenciais



Fonte: PMI (PMBOK® Guide) | Katz (Project Management).

Experiência e Atitudes

Experiência

- Profissional
- Cultural

↓

Amplia repertório

\+

Atitudes

- Proatividade
- Motivação
- Feedback

→

Competência no Projeto



Mais preparado
para os desafios do projeto.

Fonte: PMI. *Talent Triangle. Project Management Institute.* | *PMI. PMBOK® Guide. Project Management Institute.*

O Gerente e a Equipe

Competências complementares

Comprometimento

Motivação

Orientação & conflitos



Gerente de Projeto
Líder e facilitador

Equipe de alto desempenho

Referências: PMI/PMBOK; Thamhain (2003, 2004, 2010); Peterson (2007)

Stakeholders

Partes interessadas que fazem o projeto acontecer.

Quem são?

São partes interessadas no projeto.

Participação


Participam da definição e validação do que deverá ser entregue.

Resultado

Contribuem para entregas alinhadas às necessidades do negócio.

Influência

Sua influência tende a ser maior no início do projeto.

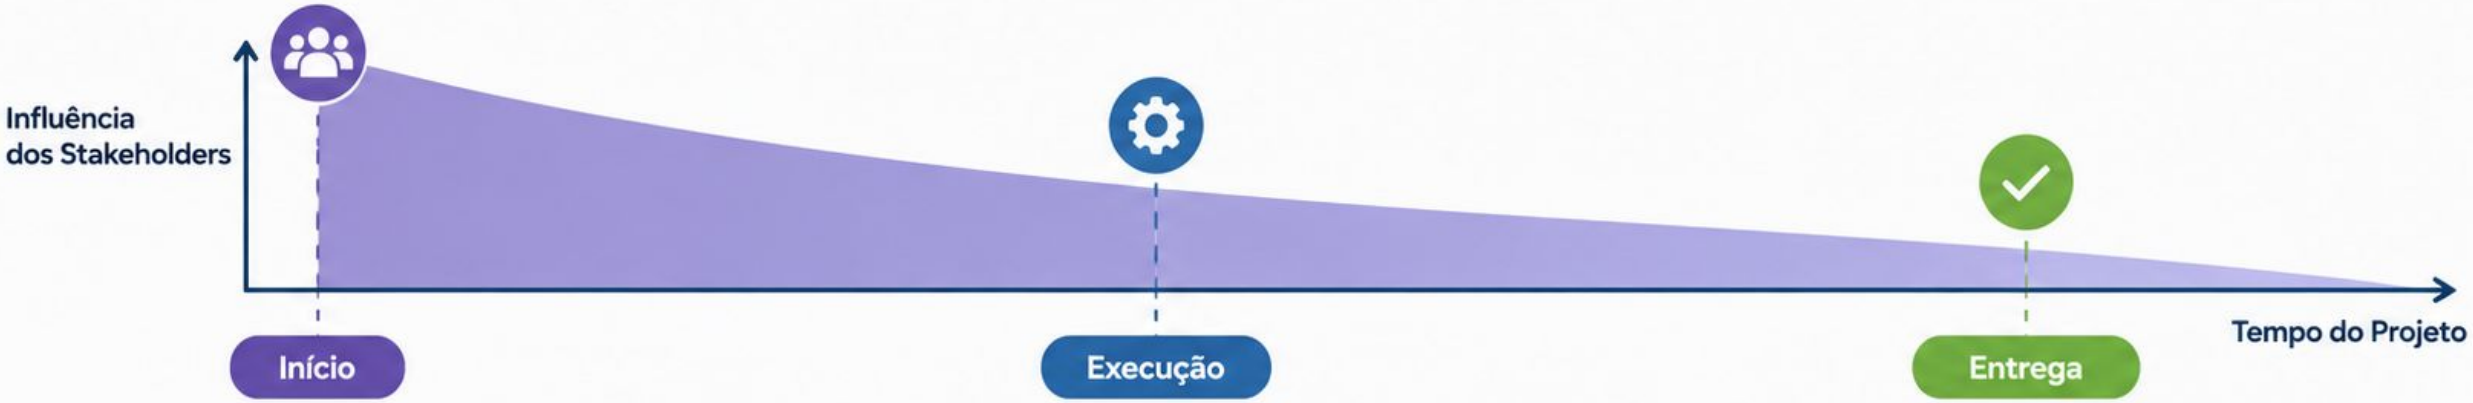

Fonte: PMI (2021); Kerzner (2017).

O Problema da Comunicação

Se a comunicação falha, a entrega pode se afastar da necessidade real.

- **Desalinhamento** de **expectativas** entre equipe, cliente e stakeholders.
- **Erros** e **retrabalho** devido a informações incompletas ou incorretas.
- **Atrasos** no **cronograma** e **aumento** dos **custos** do projeto.
- **Conflitos** na equipe, perda de confiança e redução da colaboração.
- **Decisões equivocadas**, principalmente quando informações importantes não chegam às pessoas certas.
- **Problemas de qualidade**, quando requisitos e critérios não são compreendidos corretamente.
- Em situações graves, o **projeto pode não atingir seus objetivos** ou até **fracassar**.



INFLUÊNCIA × CUSTO DA MUDANÇA



Base: PMI/PMBOK® Guide; Heerkens (2014); Vogwell (2003)

Planejamento e Estimativas

Estimativas realistas

- Prazo
- Custo
- Insumos
- Escopo

Transparência
com o cliente

Recursos humanos

- Equipe
- Competências

Recursos materiais

- Equipamentos
- Infraestrutura


Melhor planejamento → Menos riscos → Mais previsibilidade

Base: PMBOK® Guide (PMI, 2021); Kerzner (2017); Sommerville (2019).

Antecipação de Riscos

1 Identificar riscos

Situações que podem comprometer objetivos.



2 Antecipar-se

Analisar e priorizar os riscos.



3 Planos de contingência

Definir ações para problemas prováveis.



Maior chance de sucesso do projeto

Referências: PMI/PMBOK; Hillson (Risk Management); Kerzner (Project Management)

Mudança de Escopo

Mudanças no negócio



Negócios e requisitos mudam.

Avaliar impactos



Prazo, custo, recursos e qualidade.

Negociar alternativas



Buscar a melhor solução.

Manter o foco



Objetivo do cliente em primeiro lugar.

Decisão equilibrada
para o sucesso do projeto

Referências: PMI/PMBOK; Kerzner (Project Management); Schwalbe (Information Technology Project Management).

Monitoramento

1 Verificar o progresso

Após o planejamento.



2 Acompanhar atividades e resultados



3 Comunicar desvios



4 Manter stakeholders informados





- Mais controle
- Menos riscos
- Decisões rápidas
- Maior alinhamento

Referências: PMI/PMBOK; Kerzner (Project Management); Schwalbe (Information Technology Project Management).

Controle e Ações Corretivas

1 Controle

Permite agir diante de problemas.



2 Preventivas

Reduzem a chance de ocorrência.



3 Corretivas

Tratam desvios identificados.



- Ajuste
- Reparo
- Replanejamento

Projeto no rumo certo

Referências: PMI/PMBOK; Kerzner (Project Management); Schwalbe (Information Technology Project Management).

Síntese Gerencial

1. Planejar
2. Organizar
3. Dirigir
4. Monitorar
5. Controlar









Liderança e negociação complementam o conhecimento técnico.



Stakeholders precisam ser envolvidos e ouvidos.

Referências: PMI (PMBOK); Kerzner (Project Management); Schwable (Information Technology Project Management).

Reflexões

Reflexão 1

Gestão de projetos combina a gestão técnica e a gestão de pessoas. O que é mais complexo para você?

Reflexão 2

Projetos exigem negociar e comunicar objetivos, planejamento, acompanhamento e encerramento.

Reflexão 3

O gerente deve manter foco no cliente e no resultado. Quais habilidades ele precisa desenvolver para conciliar isso?

Bons estudos!

Siga em frente com a



www.unicesumar.edu.br
